M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology

작업 보고서

작성	검토	승인
조재현		

점검일	2023년 3월 27일			
점검 시간	19:00	~	1:30	6:30

업 체 명	온세미컨덕터	MODEL	1701HW	SET-UP 일	2022년 6월 20일
고객 담당자	김일남 부장님	SERIAL NO	M006829	이전 작업일	2023년 2월 21일
MAT 작업자	정동교 , 조재현	공정명	H2	경과일	34

1. 작업명

Heater 1EA 교체 , Pre Wet 막힘 임시조치

2. 증상

SCR S상 Over Current알람발생

3. 원인

2-1번 존 Heater 내부 코일간 쇼트로 인해 Over Current 발생

3. 조치내용

* S상 Over Current 발생

- Heater 전체 저항점검 진행
- 2-1번 Heater 저항 10.23
  나머지 정상 Heater 저항 1.7
- 2-1번 Heater 탈착 진행
  → Heater 내부 코일 늘어짐
  → 늘어진 코일끼리 붙어 쇼트 발생
  → Scrubber 가동 조건으로 인하여 B/A , Inlet Purge N2 의 유량이 많아 Heater Temp 값을 유지하기 위해 Heater의 출력을 최대로 사용하여 늘어진 것으로 예상됨
  → Heater 반출 진행 후 연구소 전달하여 원인 분석 예정
- 2-1번 Heater 신품 파트 교체 진행
  → SCR 89.1A 정상 출력
- Heater 교체 진행 후 가동 Test 진행
  → 1시간 Test 진행
  → 정상 가동

*Pre Wet 막힘

- Pre Wet Level Tube 의 자석이 파우더로 인해 막혀있는 현상 발생
  → Tube 탈착 후 Cleaning 진행
  → 03/29 방문하여 작업 예정이나 Inlet.P 값이 낮아 임시조치 진행
  → Level Port 청소기로 Cleaning 진행 하여 Powder 제거
- Exh.P -120 기준 Inlet.P -60대에서 -120으로 완화
  → Exh.P -90으로 하향 조정 진행 후 Inlet.P -80대 출력

5. 사진

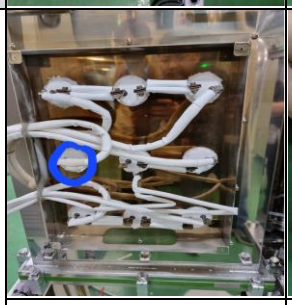
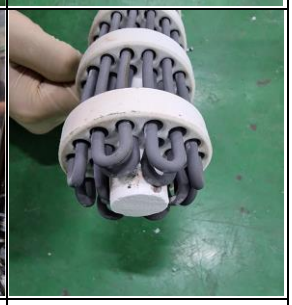

4. CHECK VALUE

Pressure	Exh. P mmH2O		Inlet. P #1 mmH2O		Inlet. P #2 mmH2O		Inlet. P #3 mmH2O		Inlet. P #4 mmH2O		Cab. P mmH2O		Cir. P #1 Kpa		Cir. P #2 Kpa		B/A. P #1 Kpa		B/A. P #2 Kpa		Steam W. P Kpa		Fog W. P Kpa	
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
		-90		-81								-11		132										
Temp	Heater. T #1		Heater. T #2		Heater. T #3		Heater. T #4		Chamber. T		Cartridge Top. T		Cartridge Bottom. T		Reactor. T		Wet. T		Cabinet. T		Exhaust. T			
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
		750																42		38		31		
유량	Heater Air☐ SLM N2☐		Sleeve Air☐ SLM N2☐		Burnning #1 Air☐ SLM N2☐		Burnning #2 Air☐ SLM N2☐		Burnning #2 Air☐ SLM N2☐		Burnning #4 Air☐ SLM N2☐		In Purge Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #1 Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #2 Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #3 Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #4 Air☐ SLM N2☐		Steam Air☐ SLM N2☐	
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후										
				80		400		400						260										
	Fog #1 Air☐ SLM N2☐		Fog #2 Air☐ SLM N2☐		Fog #3 Air☐ SLM N2☐		Fog #4 Air☐ SLM N2☐		Supply Water Air☐ LPM N2☐		PCW Air☐ LPM N2☐		Steam Water Air☐ LPM N2☐		Torch Air☐ SLM N2☐		Torch Flange Air☐ SLM N2☐		Torch 전압 A		Torch 전압 V			
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후		
		30		30		30		30		19														

*** Part 사용 이력**

Part 명	규격	Code	수 량	유/무	업체 재고	Part 명	규격	Code	수량	유/무	업체 재고
RADIANT HEATER (1501HW)	69.3Vac,3.3KW	1501-901-01	1	무상							
						출장비		인원수		유/무상	
								2		무상	
